

## 旧江之島水泳場北側駐車場 借地に関する協議

工 事 名 令和4年度[第34-B4506-01号]  
二級河川馬込川4年災害復旧工事(4年災査定第136号)(護岸工)

施 工 箇 所 浜松市 南区 江之島町 地先

工 期 令和5年2月28日 ~ 令和6年2月29日

借 地 期 間 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

発 注 者 静岡県 交通基盤部 浜松土木事務所 工事課工事第1班

担当：戸田 晃裕 TEL 053-458-7274

施 工 会 社 須山建設株式会社


担当：川畑 勇斗 TEL 080-2605-7664

工 事 概 要 プレキャスト笠コンクリート 142m  
鋼矢板打込工(パイプロハンマウオータージェット併用) 158枚  
コンクリートブロック基礎 142m  
平ブロック張 346㎡  
法枠D-1、D-2張 743㎡

### 現場位置図



詳細図

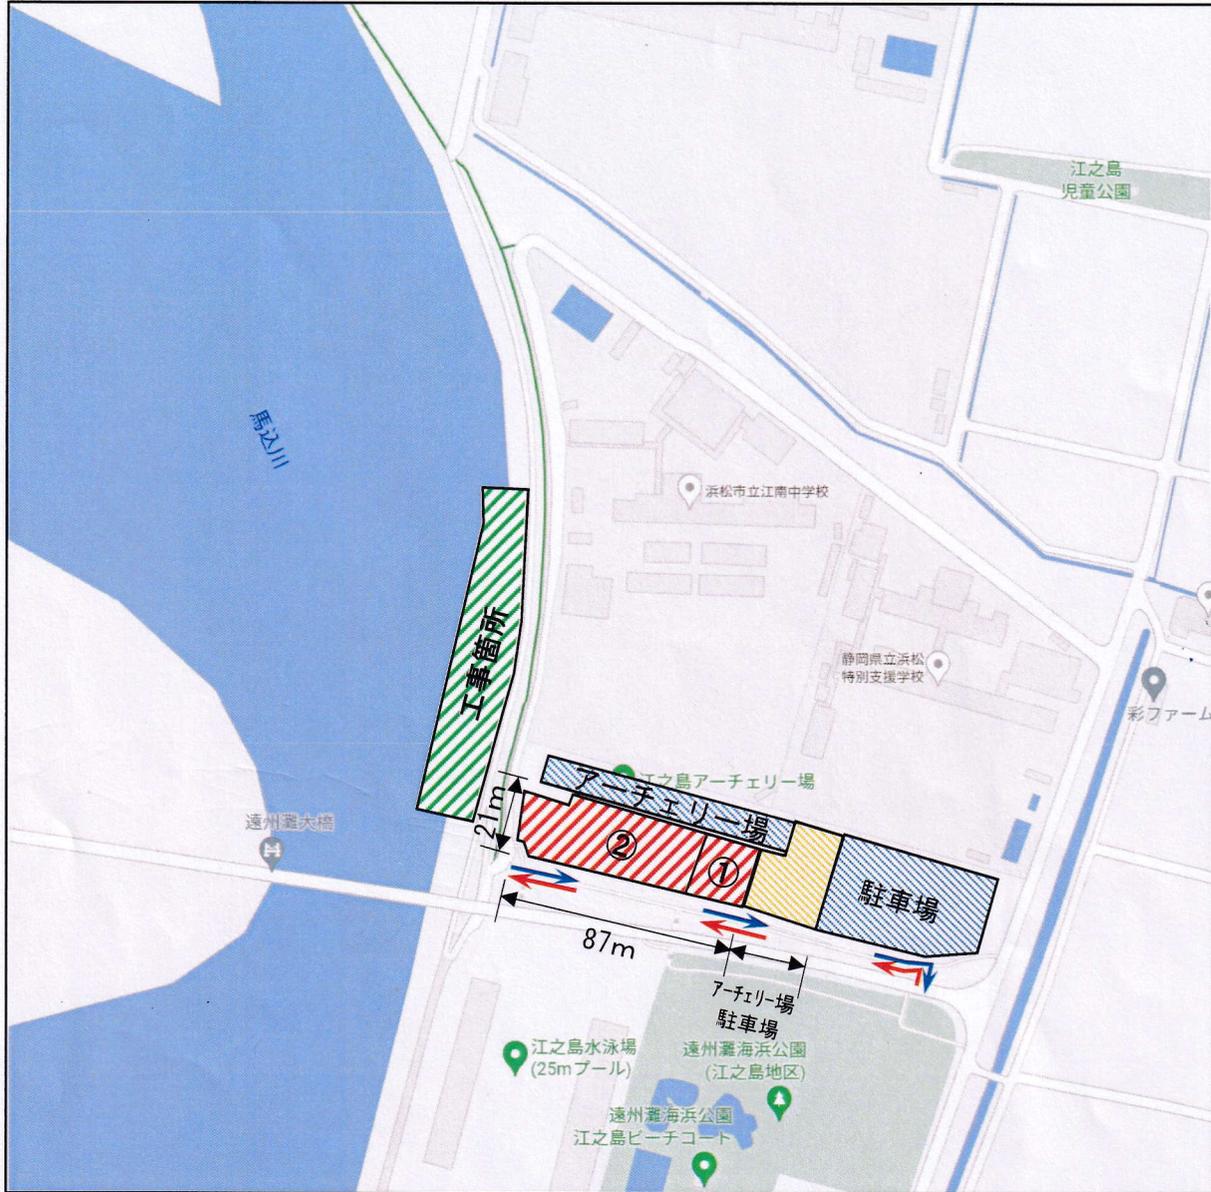

-  ① : 現場事務所、作業員駐車場ヤード
-  ② : クローラクレーン組立・解体、Coガラ破碎、大型土嚢・袋詰玉石製作ヤード
-  : アーチェリー場駐車場
-  : 工事車両搬入出経路

①+②借地面積 1,790㎡

工事車両搬入出経路 幅員5.5m

工事車両 予定	トレーラー	鋼矢板、敷鉄板、クローラクレーン、0.7m3BH、0.45m3BH
	4t~15tトラック	コンクリート2次製品、鋼矢板施工機械、その他資材
	10tセルフ	0.25m3BH、0.1m3BH、4t振動ローラ
	2t~10tダンプ	土砂、碎石、コンクリートガラ等
	25t、50tラフタークレーン	資機材揚重
	普通車	作業員通勤車両



## 工 程 表


工種	令和5年												令和6年	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工	■													
仮設道路工			■								■			
鋼矢板打込工				■										
袋詰玉石工						■								
構造物取壊し工					■			■						
法覆護岸工						■								
片付け												■		
①、②ヤード	■													
工事車両搬入出経路	■													

※工事の進捗により工程が変更になる可能性があります。

## 現 地 写 真



①、②ヤード 現況写真

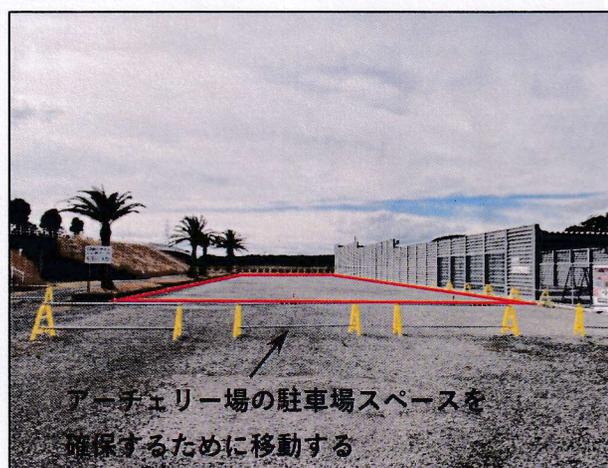

アーチェリー場駐車場 現況写真

## 注 意 事 項

- ・ 工事車両通行時は最徐行にて通行する。
- ・ 第三者最優先で工事車両は通行する。
- ・ ホコリの発生をできる限り抑制する。
- ・ 苦情が発生した場合は真摯に対応する。
- ・ ①、②ヤード周辺には、関係者以外立ち入れないよう工事フェンスを設置する。
